




PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO URBANO E DI MARGINE CON AMBITI RURALI - PERCORSI CICLOPEDONALI - REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA PERIFERIA EST"

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

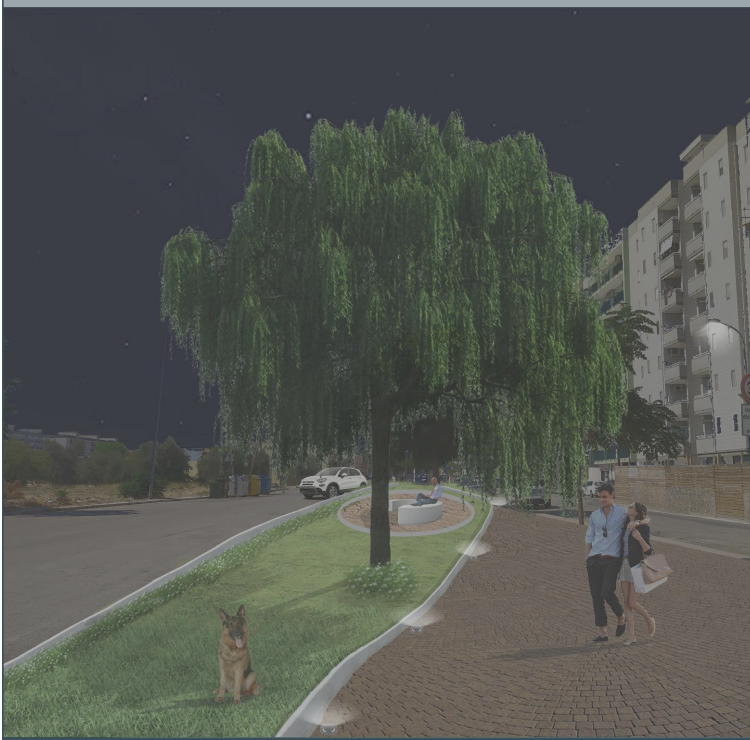

PROGETTISTA - CSP - CSE
DOTT. ING. GIUSEPPE CERVAROLO



PROGETTISTA
ING. ANNA MARIA MIRACCO



R.U.P.
ING. PAOLO DELLORUSSO

PROGETTISTA
ARCHEOLOGO GIACOMO D'ELIA

Dott. GIACOMO D'ELIA
ARCHEOLOGO
Via Mario Di Lecce, 14
73100 LECCE
Cod. Fisc.: DLE GCM 72T04 E986K
Partita IVA 03090370739

Giacomo D'Elia

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	OTTOBRE 2021	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO	ING. GIUSEPPE CERVAROLO
B					
C					

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Realizzazione della ciclovia periferia est

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

"Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di collegamento con il centro urbano e di margine con ambiti rurali - percorsi ciclopedonali - Realizzazione della ciclovia periferia est"

N.	FASI LAVORATIVE	NUMERO MESE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE					
			Numero settimana	DURATA (gg)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Allestimento cantiere stradale - Area intervento 1	3																										
	AREA INTERVENTO 1 - VIA UGO LA MALFA	34																										
	Movimento terra - demolizioni - trasporti e conferimenti in discarica	5																										
	Asportazione strato di usura - fresatura	2																										
	Realizzazione aree pedonali - massetto, cordoli e pavimentazione	15																										
	Formazione del manto di usura, collegamento e base	7																										
	Arredo, verde urbano e illuminazione	5																										
	Smontaggio area cantiere - Area intervento 1	2																										
2	Allestimento cantiere stradale - Area intervento 2	2																										
	AREA INTERVENTO 2 - PIAZZALE GIANNI RODARI	59																										
	Movimento terra - demolizioni - trasporti e conferimenti in discarica	10																										
	Asportazione strato di usura - fresatura	7																										
	Realizzazione aree pedonali - massetto, cordoli e pavimentazione	25																										
	Formazione del manto di usura, collegamento e base	7																										
	Arredo, verde urbano e illuminazione	10																										
	Smontaggio area cantiere - Area intervento 2	2																										
	Allestimento cantiere stradale - Area intervento 3	2																										
3	AREA INTERVENTO 3 - VIA DON LUIGI STURZO	37																										
	Movimento terra - demolizioni - trasporti e conferimenti in discarica	5																										
	Asportazione strato di usura - fresatura	5																										
	Realizzazione aree pedonali - massetto, cordoli e pavimentazione	15																										
	Formazione del manto di usura, collegamento e base	7																										
	Arredo, verde urbano e illuminazione	5																										
	Smontaggio area cantiere - Area intervento 3	2																										
	Allestimento cantiere stradale - Area intervento 4	2																										
4	AREA INTERVENTO 4 - VIA PALMIRO TOGLIATTI	31																										
	Demolizioni - trasporti e conferimenti in discarica	7																										
	Asportazione strato di usura - fresatura	2																										
	Realizzazione aree pedonali - massetto, cordoli e pavimentazione	15																										
	Formazione del manto di usura, collegamento e base	5																										
	Arredo, verde urbano e illuminazione	2																										
	Smontaggio area cantiere - Area intervento 4	4																										
		180																										
